上海市松江区公共卫生中心新建工程项目（除桩基工程）总进度计划
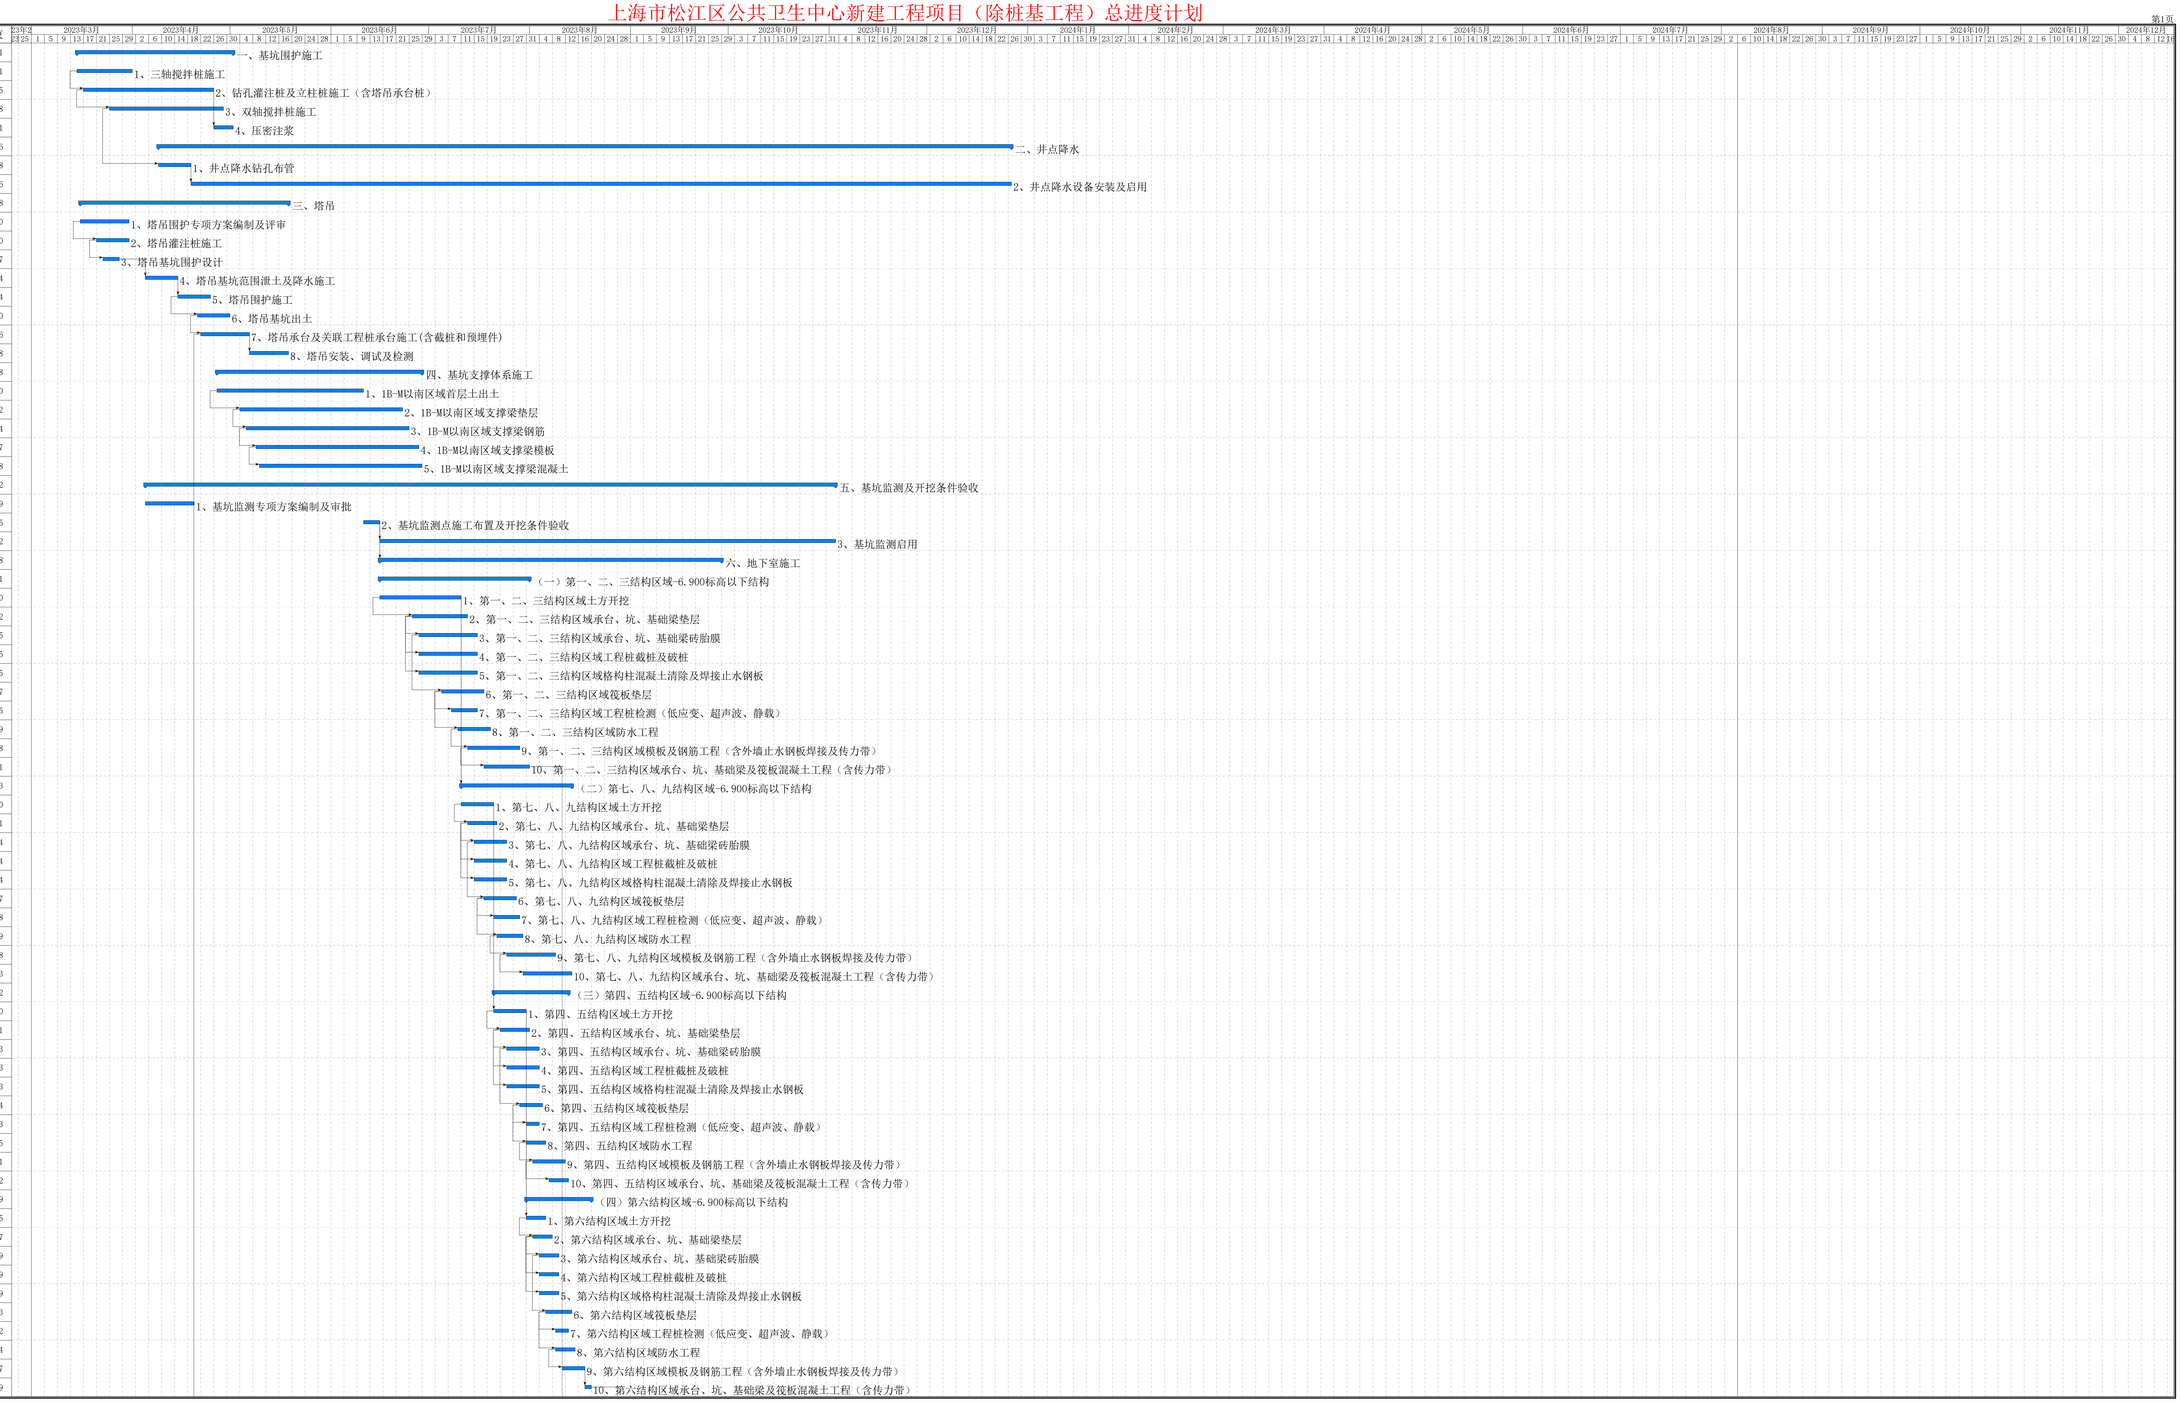
编号	工作名称	计划工期	计划开始	计划结束
1	一、基坑围护施工	48	2023-03-15	2023-05-01
2	1、三轴搅拌桩施工	17	2023-03-15	2023-03-31
3	2、钻孔灌注桩及立柱桩施工（含塔吊承台桩）	40	2023-03-17	2023-04-25
4	3、双轴搅拌桩施工	35	2023-03-25	2023-04-28
5	4、压密注浆	6	2023-04-26	2023-05-01
6	二、井点降水	262	2023-04-09	2023-12-26
7	1、井点降水钻孔布管	10	2023-04-09	2023-04-18
8	2、井点降水设备安装及启用	252	2023-04-19	2023-12-26
9	三、塔吊	64	2023-03-16	2023-05-18
10	1、塔吊围护专项方案编制及评审	15	2023-03-16	2023-03-30
11	2、塔吊灌注桩施工	10	2023-03-21	2023-03-30
12	3、塔吊基坑围护设计	5	2023-03-23	2023-03-27
13	4、塔吊基坑范围泄土及降水施工	10	2023-04-05	2023-04-14
14	5、塔吊围护施工	10	2023-04-15	2023-04-24
15	6、塔吊基坑出土	10	2023-04-21	2023-04-30
16	7、塔吊承台及关联工程桩承台施工(含截桩和预埋件)	15	2023-04-22	2023-05-06
17	8、塔吊安装、调试及检测	12	2023-05-07	2023-05-18
18	四、基坑支撑体系施工	63	2023-04-27	2023-06-28
19	1、1B-M以南区域首层土出土	45	2023-04-27	2023-06-10
20	2、1B-M以南区域支撑梁垫层	50	2023-05-04	2023-06-22
21	3、1B-M以南区域支撑梁钢筋	50	2023-05-06	2023-06-24
22	4、1B-M以南区域支撑梁模板	50	2023-05-09	2023-06-27
23	5、1B-M以南区域支撑梁混凝土	50	2023-05-10	2023-06-28
24	五、基坑监测及开挖条件验收	212	2023-04-05	2023-11-02
25	1、基坑监测专项方案编制及审批	15	2023-04-05	2023-04-19
26	2、基坑监测点施工布置及开挖条件验收	5	2023-06-11	2023-06-15
27	3、基坑监测启用	140	2023-06-16	2023-11-02
28	六、地下室施工	105	2023-06-16	2023-09-28
29	（一）第一、二、三结构区域-6.900标高以下结构	46	2023-06-16	2023-07-31
30	1、第一、二、三结构区域土方开挖	25	2023-06-16	2023-07-10
31	2、第一、二、三结构区域承台、坑、基础梁垫层	17	2023-06-26	2023-07-12
32	3、第一、二、三结构区域承台、坑、基础梁砖胎膜	18	2023-06-28	2023-07-15
33	4、第一、二、三结构区域工程桩截桩及破桩	18	2023-06-28	2023-07-15
34	5、第一、二、三结构区域格构柱混凝土清除及焊接止水钢板	18	2023-06-28	2023-07-15
35	6、第一、二、三结构区域筏板垫层	13	2023-07-05	2023-07-17
36	7、第一、二、三结构区域工程桩检测（低应变、超声波、静载）	8	2023-07-08	2023-07-15
37	8、第一、二、三结构区域防水工程	10	2023-07-10	2023-07-19
38	9、第一、二、三结构区域模板及钢筋工程（含外墙止水钢板焊接及传力带）	16	2023-07-13	2023-07-28
39	10、第一、二、三结构区域承台、坑、基础梁及筏板混凝土工程（含传力带）	14	2023-07-18	2023-07-31
40	（二）第七、八、九结构区域-6.900标高以下结构	34	2023-07-11	2023-08-13
41	1、第七、八、九结构区域土方开挖	10	2023-07-11	2023-07-20
42	2、第七、八、九结构区域承台、坑、基础梁垫层	9	2023-07-13	2023-07-21
43	3、第七、八、九结构区域承台、坑、基础梁砖胎膜	10	2023-07-15	2023-07-24
44	4、第七、八、九结构区域工程桩截桩及破桩	10	2023-07-15	2023-07-24
45	5、第七、八、九结构区域格构柱混凝土清除及焊接止水钢板	10	2023-07-15	2023-07-24
46	6、第七、八、九结构区域筏板垫层	10	2023-07-18	2023-07-27
47	7、第七、八、九结构区域工程桩检测（低应变、超声波、静载）	8	2023-07-21	2023-07-28
48	8、第七、八、九结构区域防水工程	8	2023-07-22	2023-07-29
49	9、第七、八、九结构区域模板及钢筋工程（含外墙止水钢板焊接及传力带）	15	2023-07-25	2023-08-08
50	10、第七、八、九结构区域承台、坑、基础梁及筏板混凝土工程（含传力带）	15	2023-07-30	2023-08-13
51	（三）第四、五结构区域-6.900标高以下结构	23	2023-07-21	2023-08-12
52	1、第四、五结构区域土方开挖	10	2023-07-21	2023-07-30
360	2、第四、五结构区域承台、坑、基础梁垫层	9	2023-07-23	2023-07-31
370	3、第四、五结构区域承台、坑、基础梁砖胎膜	10	2023-07-25	2023-08-03
380	4、第四、五结构区域工程桩截桩及破桩	10	2023-07-25	2023-08-03
390	5、第四、五结构区域格构柱混凝土清除及焊接止水钢板	10	2023-07-25	2023-08-03
400	6、第四、五结构区域筏板垫层	7	2023-07-29	2023-08-04
405	7、第四、五结构区域工程桩检测（低应变、超声波、静载）	4	2023-07-31	2023-08-03
410	8、第四、五结构区域防水工程	6	2023-07-31	2023-08-05
420	9、第四、五结构区域模板及钢筋工程（含外墙止水钢板焊接及传力带）	10	2023-08-02	2023-08-11
340	10、第四、五结构区域承台、坑、基础梁及筏板混凝土工程（含传力带）	6	2023-08-07	2023-08-12
69	（四）第六结构区域-6.900标高以下结构	20	2023-07-31	2023-08-19
430	1、第六结构区域土方开挖	6	2023-07-31	2023-08-05
440	2、第六结构区域承台、坑、基础梁垫层	6	2023-08-02	2023-08-07
450	3、第六结构区域承台、坑、基础梁砖胎膜	6	2023-08-04	2023-08-09
460	4、第六结构区域工程桩截桩及破桩	6	2023-08-04	2023-08-09
470	5、第六结构区域格构柱混凝土清除及焊接止水钢板	6	2023-08-04	2023-08-09
480	6、第六结构区域筏板垫层	8	2023-08-06	2023-08-13
485	7、第六结构区域工程桩检测（低应变、超声波、静载）	4	2023-08-09	2023-08-12
490	8、第六结构区域防水工程	6	2023-08-09	2023-08-14
500	9、第六结构区域模板及钢筋工程（含外墙止水钢板焊接及传力带）	7	2023-08-11	2023-08-17
510	10、第六结构区域承台、坑、基础梁及筏板混凝土工程（含传力带）	2	2023-08-18	2023-08-19
