上海市松江区公共卫生中心新建工程项目（除桩基工程）总进度计划
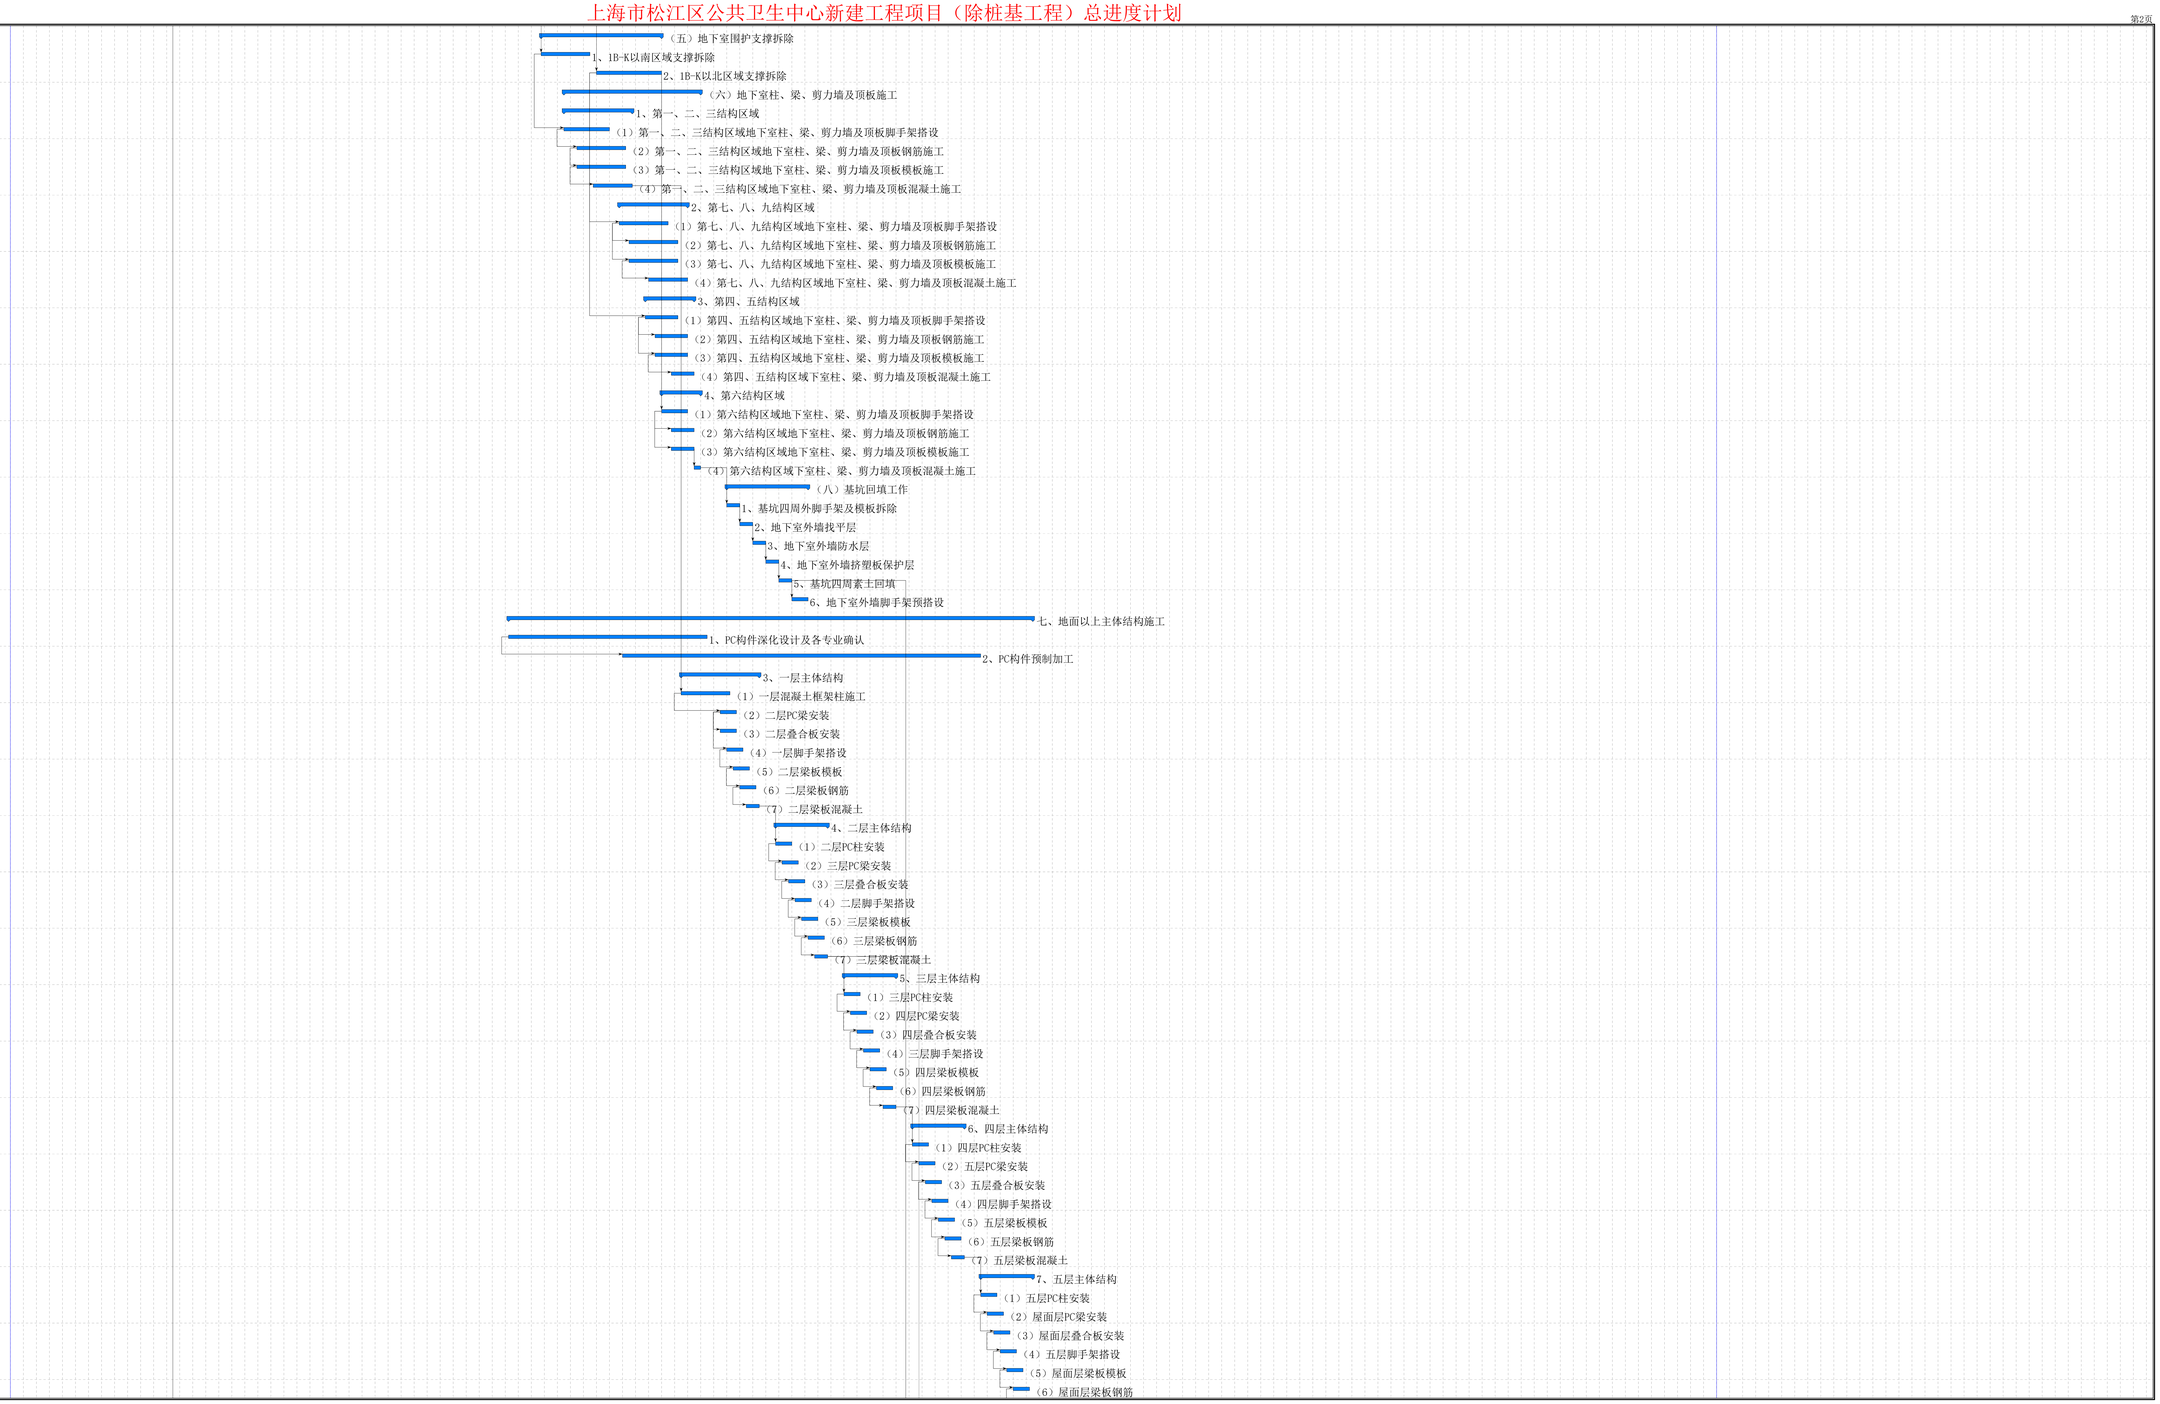
90	（五）地下室围护支撑拆除	37	2023-08-11	2023-09-16
92	1、1B-K以南区域支撑拆除	15	2023-08-11	2023-08-25
93	2、1B-K以北区域支撑拆除	20	2023-08-28	2023-09-16
94	（六）地下室柱、梁、剪力墙及顶板施工	42	2023-08-18	2023-09-28
95	1、第一、二、三结构区域	21	2023-08-18	2023-09-07
96	（1）第一、二、三结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板脚手架搭设	14	2023-08-18	2023-08-31
97	（2）第一、二、三结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板钢筋施工	15	2023-08-22	2023-09-05
98	（3）第一、二、三结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板模板施工	15	2023-08-22	2023-09-05
99	（4）第一、二、三结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板混凝土施工	12	2023-08-27	2023-09-07
100	2、第七、八、九结构区域	21	2023-09-04	2023-09-24
101	（1）第七、八、九结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板脚手架搭设	15	2023-09-04	2023-09-18
102	（2）第七、八、九结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板钢筋施工	15	2023-09-07	2023-09-21
103	（3）第七、八、九结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板模板施工	15	2023-09-07	2023-09-21
104	（4）第七、八、九结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板混凝土施工	12	2023-09-13	2023-09-24
105	3、第四、五结构区域	15	2023-09-12	2023-09-26
106	（1）第四、五结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板脚手架搭设	10	2023-09-12	2023-09-21
107	（2）第四、五结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板钢筋施工	10	2023-09-15	2023-09-24
108	（3）第四、五结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板模板施工	10	2023-09-15	2023-09-24
109	（4）第四、五结构区域下室柱、梁、剪力墙及顶板混凝土施工	7	2023-09-20	2023-09-26
590	4、第六结构区域	12	2023-09-17	2023-09-28
600	（1）第六结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板脚手架搭设	8	2023-09-17	2023-09-24
610	（2）第六结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板钢筋施工	7	2023-09-20	2023-09-26
620	（3）第六结构区域地下室柱、梁、剪力墙及顶板模板施工	7	2023-09-20	2023-09-26
630	（4）第六结构区域下室柱、梁、剪力墙及顶板混凝土施工	2	2023-09-27	2023-09-28
110	（八）基坑回填工作	25	2023-10-07	2023-10-31
111	1、基坑四周外脚手架及模板拆除	4	2023-10-07	2023-10-10
112	2、地下室外墙找平层	4	2023-10-11	2023-10-14
113	3、地下室外墙防水层	4	2023-10-15	2023-10-18
114	4、地下室外墙挤塑板保护层	4	2023-10-19	2023-10-22
115	5、基坑四周素土回填	4	2023-10-23	2023-10-26
116	6、地下室外墙脚手架预搭设	5	2023-10-27	2023-10-31
117	七、地面以上主体结构施工	161	2023-08-01	2024-01-08
118	1、PC构件深化设计及各专业确认	61	2023-08-01	2023-09-30
119	2、PC构件预制加工	110	2023-09-05	2023-12-23
120	3、一层主体结构	24	2023-09-23	2023-10-16
121	（1）一层混凝土框架柱施工	15	2023-09-23	2023-10-07
122	（2）二层PC梁安装	5	2023-10-05	2023-10-09
123	（3）二层叠合板安装	5	2023-10-05	2023-10-09
124	（4）一层脚手架搭设	5	2023-10-07	2023-10-11
125	（5）二层梁板模板	5	2023-10-09	2023-10-13
126	（6）二层梁板钢筋	5	2023-10-11	2023-10-15
127	（7）二层梁板混凝土	4	2023-10-13	2023-10-16
128	4、二层主体结构	16	2023-10-22	2023-11-06
129	（1）二层PC柱安装	5	2023-10-22	2023-10-26
130	（2）三层PC梁安装	5	2023-10-24	2023-10-28
131	（3）三层叠合板安装	5	2023-10-26	2023-10-30
132	（4）二层脚手架搭设	5	2023-10-28	2023-11-01
133	（5）三层梁板模板	5	2023-10-30	2023-11-03
134	（6）三层梁板钢筋	5	2023-11-01	2023-11-05
135	（7）三层梁板混凝土	4	2023-11-03	2023-11-06
136	5、三层主体结构	16	2023-11-12	2023-11-27
137	（1）三层PC柱安装	5	2023-11-12	2023-11-16
138	（2）四层PC梁安装	5	2023-11-14	2023-11-18
139	（3）四层叠合板安装	5	2023-11-16	2023-11-20
140	（4）三层脚手架搭设	5	2023-11-18	2023-11-22
141	（5）四层梁板模板	5	2023-11-20	2023-11-24
142	（6）四层梁板钢筋	5	2023-11-22	2023-11-26
143	（7）四层梁板混凝土	4	2023-11-24	2023-11-27
144	6、四层主体结构	16	2023-12-03	2023-12-18
145	（1）四层PC柱安装	5	2023-12-03	2023-12-07
146	（2）五层PC梁安装	5	2023-12-05	2023-12-09
147	（3）五层叠合板安装	5	2023-12-07	2023-12-11
148	（4）四层脚手架搭设	5	2023-12-09	2023-12-13
149	（5）五层梁板模板	5	2023-12-11	2023-12-15
150	（6）五层梁板钢筋	5	2023-12-13	2023-12-17
151	（7）五层梁板混凝土	4	2023-12-15	2023-12-18
152	7、五层主体结构	16	2023-12-24	2024-01-08
153	（1）五层PC柱安装	5	2023-12-24	2023-12-28
154	（2）屋面层PC梁安装	5	2023-12-26	2023-12-30
155	（3）屋面层叠合板安装	5	2023-12-28	2024-01-01
156	（4）五层脚手架搭设	5	2023-12-30	2024-01-03
157	（5）屋面层梁板模板	5	2024-01-01	2024-01-05
158	（6）屋面层梁板钢筋	5	2024-01-03	2024-01-07
